



DARON & ASSOCIES ARCHITECTURE

1 Rampes Ozoux - 97 400 SAINT DENIS

GSM: 0692 61 89 55 - E-MAIL : xavier_daron@orange.fr

1701
CH08

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER N°8

DU 29/05/2018

RAVALEMENT DES FACADES VARANGUES & PARTIES COMMUNES DU PARC LOCATIF DE LA SEDRE EN 2018

LOT 3 – RESIDENCE MONTPLAISIR

Adresse : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17 & 19 allée des Basaltes, 97 400 Saint Denis & cadastrée section DI parcelle n° 71, 73 & n° 129

Présents	M./Mme/Entreprise	E-MAIL	GSM	DIFF.
	M. DESRUISSEUX – SEDRE	antonio.desruisseaux@sedre.fr	0692 08 96 95	X
X	Mlle. VIRAPIN – SEDRE	anne-gaelle.virapin@sedre.fr	0692 48 59 74	X
X	M. ANAMOUTOU – ANAMOUTOU	anamoutoulivier.entreprise@yahoo.com	0692 36 45 41	X
	M. DUBOC – ID-BAT (CSPS)	igor.duboc@wanadoo.fr	0692 99 46 75	X
X	M. FONTAINE – MAUVILAC	jean.luc.fontaine@mauvilac.com	0692 25 68 63	X

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : le **mardi 05/06/ 2018 à 11h00**

DEMARRAGE DE L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE : LE 17/04/2018

AVANCEMENT

Effectif : 7

en cours : peinture des façades exposées - tous bâtiments, à des degrés d'avancement variables

en cours : peinture des cages d'escalier – tous bâtiments, à des degrés d'avancement variables

MISES AU POINT DES TRAVAUX

Fiches techniques – reste à transmettre :

BAE :

=> cf. précédents comptes rendus & documents ci joints

(tableau récapitulatif par bâtiment & façades annotées)

=> RAPPEL : prototype, échantillon ou PAC à transmettre

Convenu

=> peinture des mains courantes sur murs moellons : à prévoir

=> le MOE transmet un tableau d'avancement sur la base du CDPGF pour décompte mensuel entreprise

=> pose des premières BAE semaine prochaine

=> casquettes : en acier au lieu de aluminium => galvanisation à prévoir

MAÎTRE D'OUVRAGE

transmettre au maître d'œuvre par courriel copie du marché de travaux signé

PHOTOS




bâtiment A1 pignon



=> à reprendre : joint silicone sur solin



bâtiment A2 pignon

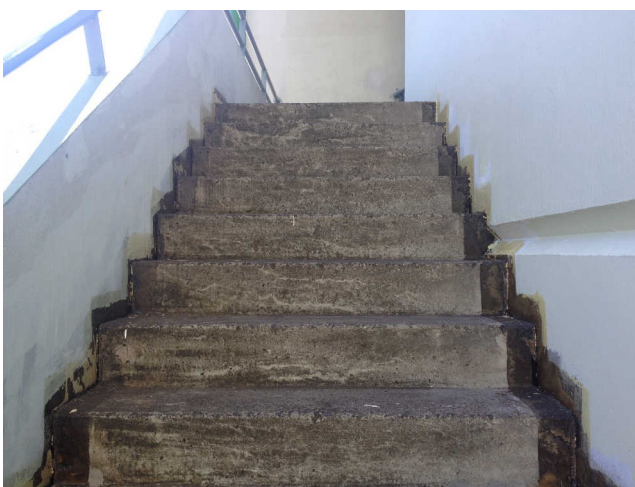

SEL dans escaliers : en cours (ici dans A1)



bâtiment B7 pignon
