



Xavier DARON Architecte DPLG

9 chemin des Écoliers 97424 Saint Paul

FAX: 0262 43 33 32 GSM: 0692 61 89 55

xavier_daron@orange.fr

CH9

COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°9

DU 06/11/2013

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"

TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN

5 LLTS

Adresse : 22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
PC n° PC 974415 12A0101

Présen	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
	M DESRUISSEAU	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55	
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
X	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
X	M. M'BAJOUNMBE	CE2J	0262 41 74 93	0262 50 18 68	0262 40 27 69	X
	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
X	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X

Lot	Observations
-----	--------------

1 PREPARATION DU CHANTIER

1.1 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER

1.1.2 Attestations d'assurances civiles et décennale

► **RAPPEL – À transmettre au maître d'œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN**

1.1.3 Fiches techniques / échantillons

► **RAPPEL - GRONDIN : transmettre fiches restantes !**

1.6 EXE / PAC

► **Menuiseries PVC & ALU : RAPPEL - plans d'atelier à transmettre**

2 AVANCEMENT DU CHANTIER

GROS OEUVRE : effectif sur site = 5

escaliers arrière des extensions : en cours – 90% ; reste longrine côté chambre logement 22 à réaliser – prévoir écoulement des eaux avant réalisation de l'escalier

mise en place des poutrelles planchers des cuisines : en cours – 100% ;

passivation des aciers et reprise enrobages des longrines des logements existants : en cours

exécution des planchers : en cours ; *réaliser préalablement les plots supports des chauffe-eau en VS*

PLOMBERIE

incorporations & réservations dans dalles : en cours

ELECTRICITE

incorporations & réservations dans dalles : en cours

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 14/11/2013 À 09H00


Page 1 / 2

PM : le maître d'œuvre se rendra le 08/11/13 sur site pour vérifier avant coulage de la dalle de compression des planchers la conformité des ferrailages

Entreprise Grondin : merci de modifier le panneau de chantier comme demandé par le maître d'ouvrage




prêtes à être coulées
(ferraillages non finalisés)

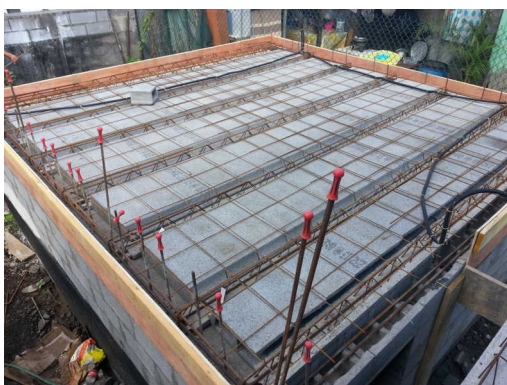

les équerres tous les 30 cm sont bien visibles



uisine (détails 1 & 2)

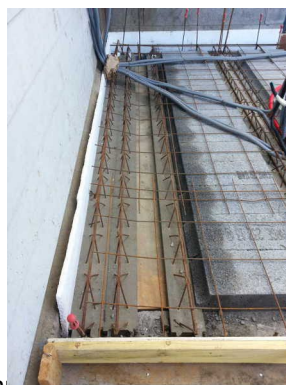

Toutes entreprises : merci de prendre en compte les remarques du contrôleur technique
